



# 名寄中学校 配置比較表-1

## A.校舎屋内運動場 一体型

### ■配置イメージ

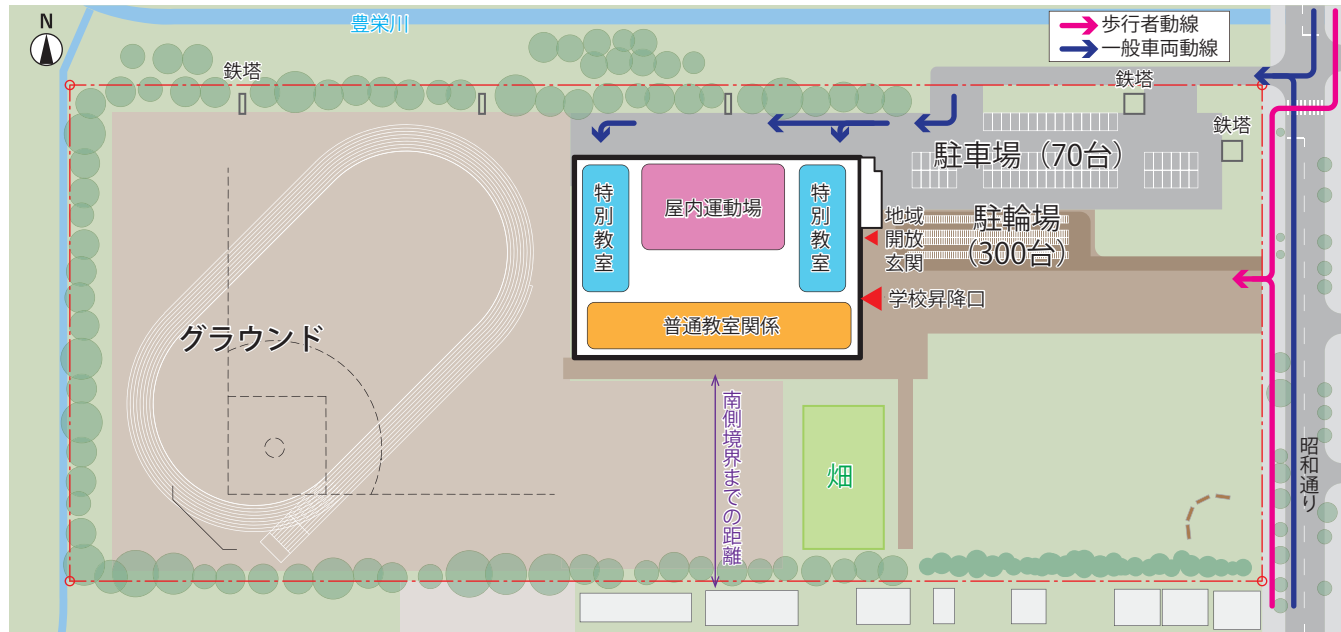

### ■建替計画図

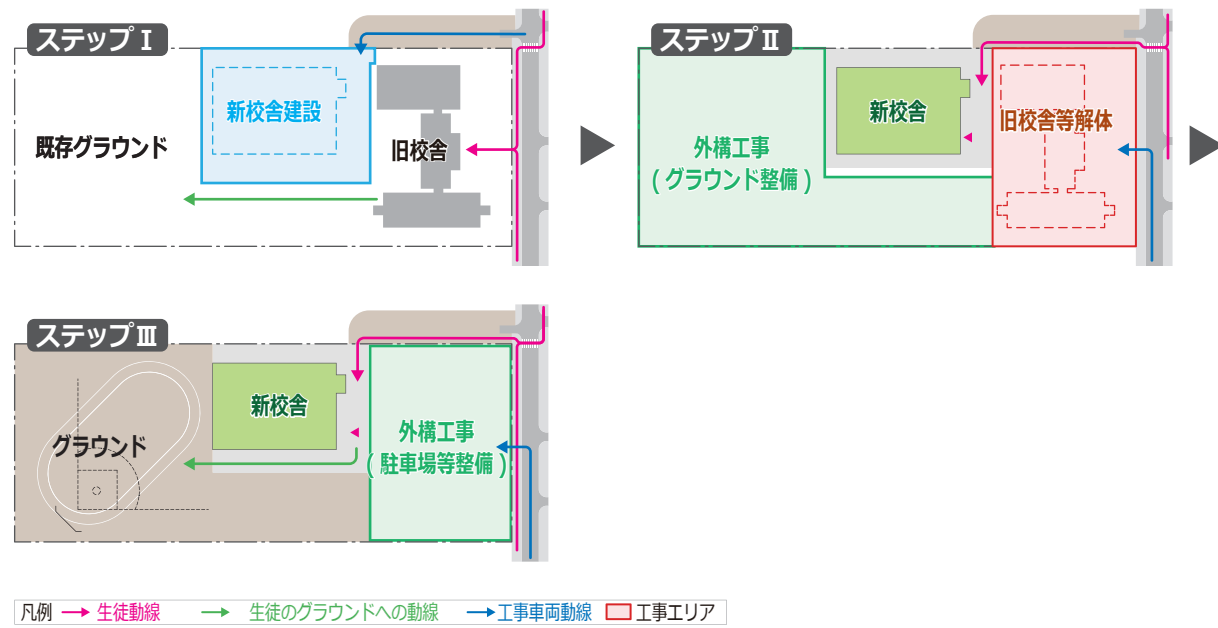


### ■建替スケジュール


令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)			令和9年度 (2027年度)			令和10年度 (2028年度)																
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
令和6年8月着工						令和8年6月竣工			令和8年8月～令和9年3月			令和9年5月～7月																
ステップⅠ 校舎屋内運動場一括工事												ステップⅡ 旧校舎等解体工事 外構工事 (グラウンド整備)			ステップⅢ 外構工事 (駐車場等整備)													

## B.校舎屋内運動場別棟 Ⅰ型

### ■配置イメージ

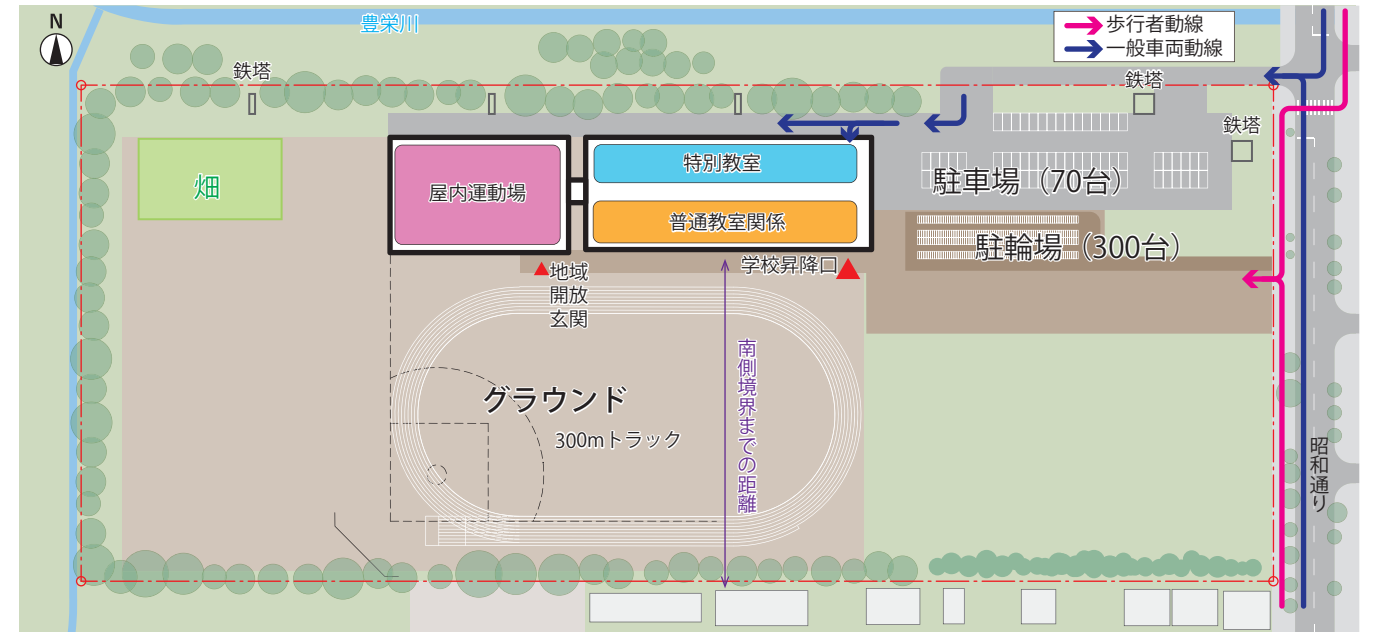

### ■建替計画図

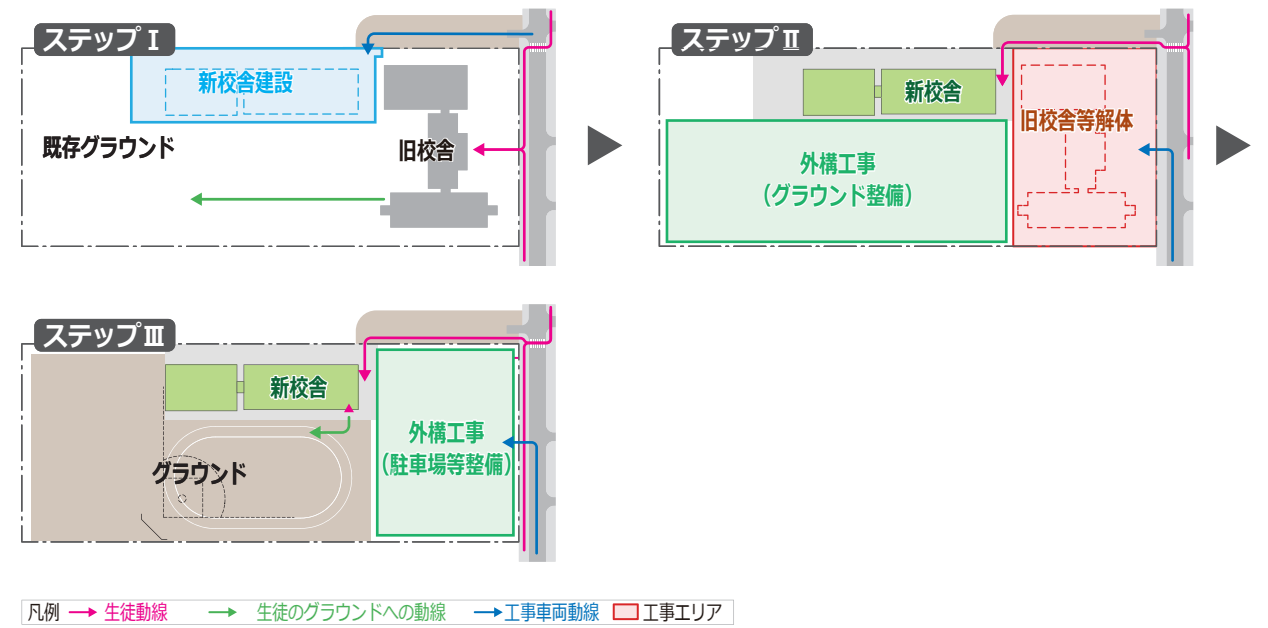

### ■建替スケジュール

令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)			令和9年度 (2027年度)			令和10年度 (2028年度)																
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
令和6年8月着工						令和8年6月竣工			令和8年8月～令和9年3月			令和9年5月～7月																
ステップⅠ 校舎屋内運動場一括工事												ステップⅡ 旧校舎等解体工事 外構工事 (グラウンド整備)			ステップⅢ 外構工事 (駐車場等整備)													


名寄中学校 配置比較表-2

C.校舎屋内運動場別棟 L型

■配置イメージ



■建替計画図

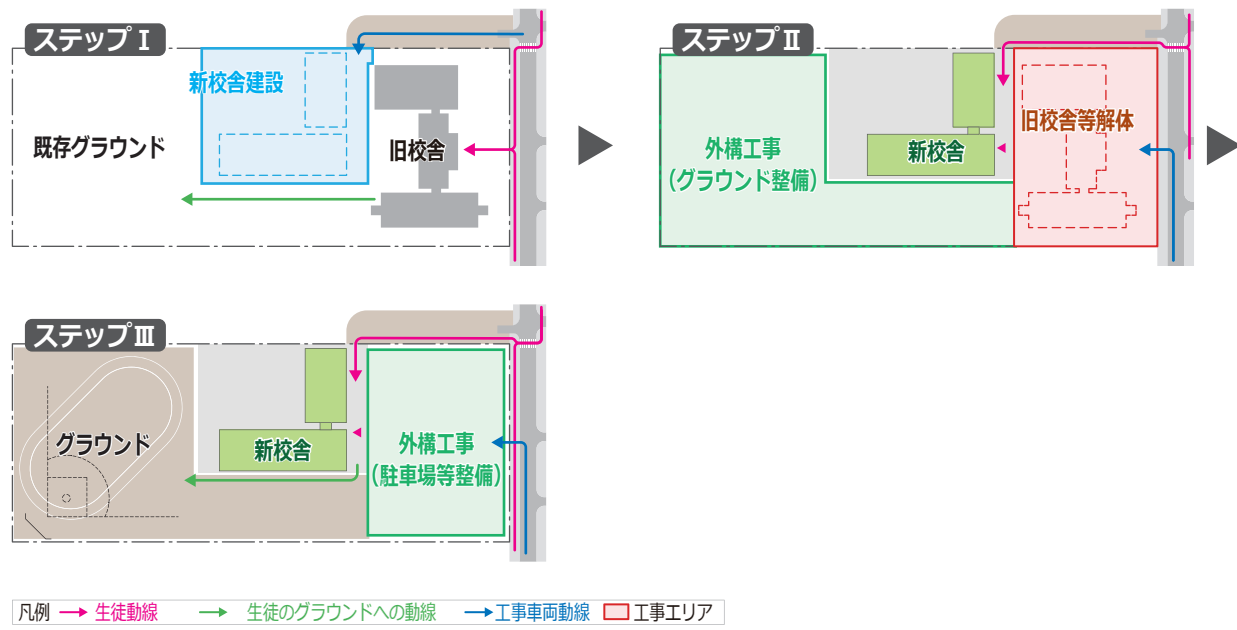


■建替スケジュール


令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)			令和9年度 (2027年度)			令和10年度 (2028年度)																	
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
令和6年8月着工						令和8年6月竣工			令和8年8月～ 令和9年3月			令和9年5月～7月																	
ステップⅠ 校舎屋内運動場一括工事												ステップⅡ 旧校舎等解体工事 外構工事(グラウンド整備)			ステップⅢ 外構工事 (駐車場等整備)														

D.校舎屋内運動場別棟 屋内運動場先

■配置イメージ

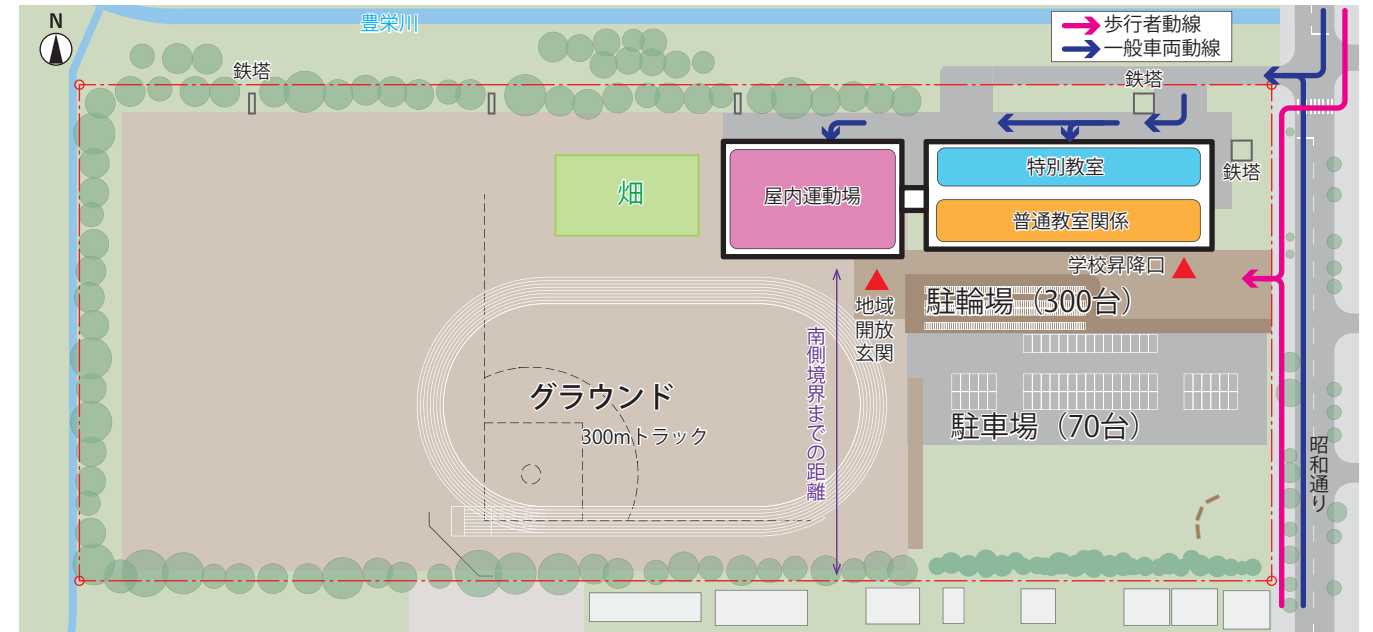

■建替計画図

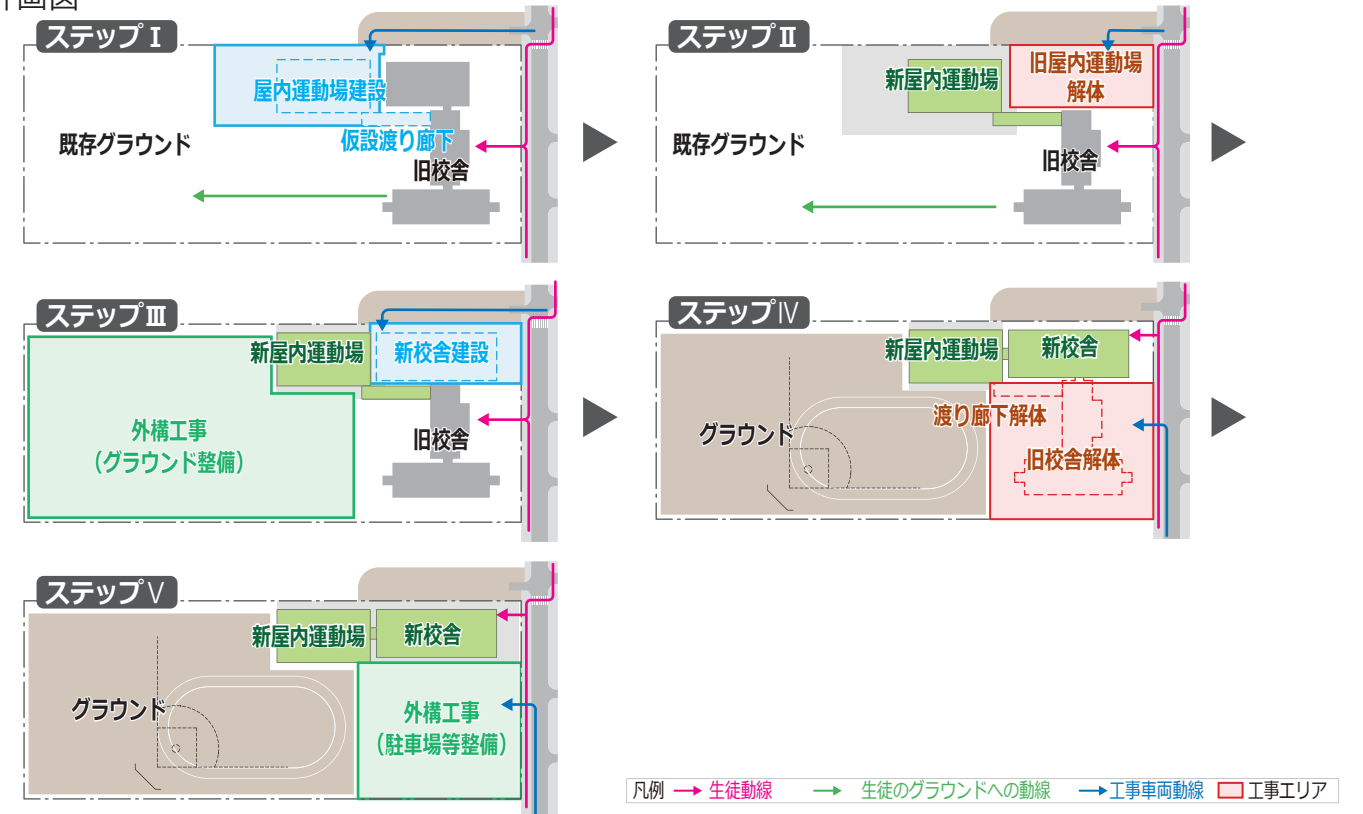


■建替スケジュール

令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)			令和9年度 (2027年度)			令和10年度 (2028年度)																							
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
令和6年8月着工			令和7年10月竣工			令和7年11月～ 令和8年4月			令和8年5月着工			令和9年9月竣工			令和9年10月～ 令和10年3月			令和10年5月～7月																	
ステップⅠ 屋内運動場工事 + 仮設渡り廊下建設												ステップⅡ 旧屋内運動場 解体工事			ステップⅢ 校舎建設工事 外構工事(グラウンド整備)			ステップⅣ 旧校舎解体工事			ステップⅤ 外構工事 (駐車場等整備)														


# 名寄中学校 配置比較表-3

## E.校舎体育館別棟 校舎先行

### ■配置イメージ

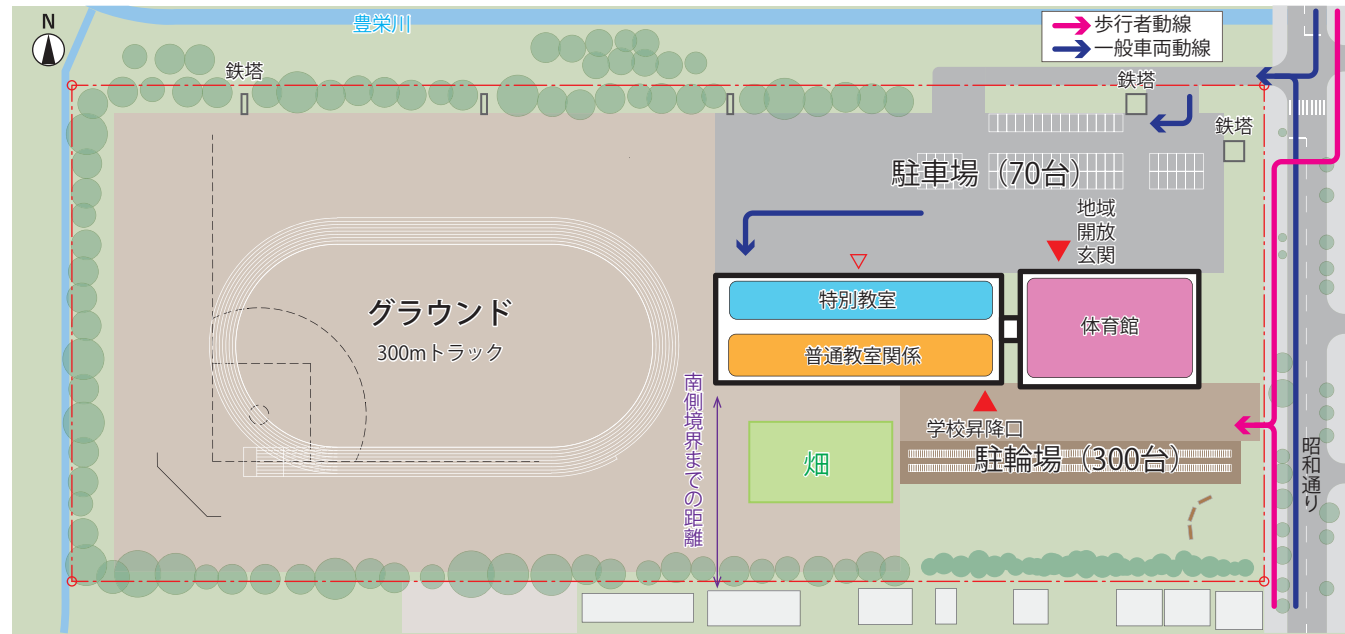

### ■建替計画図

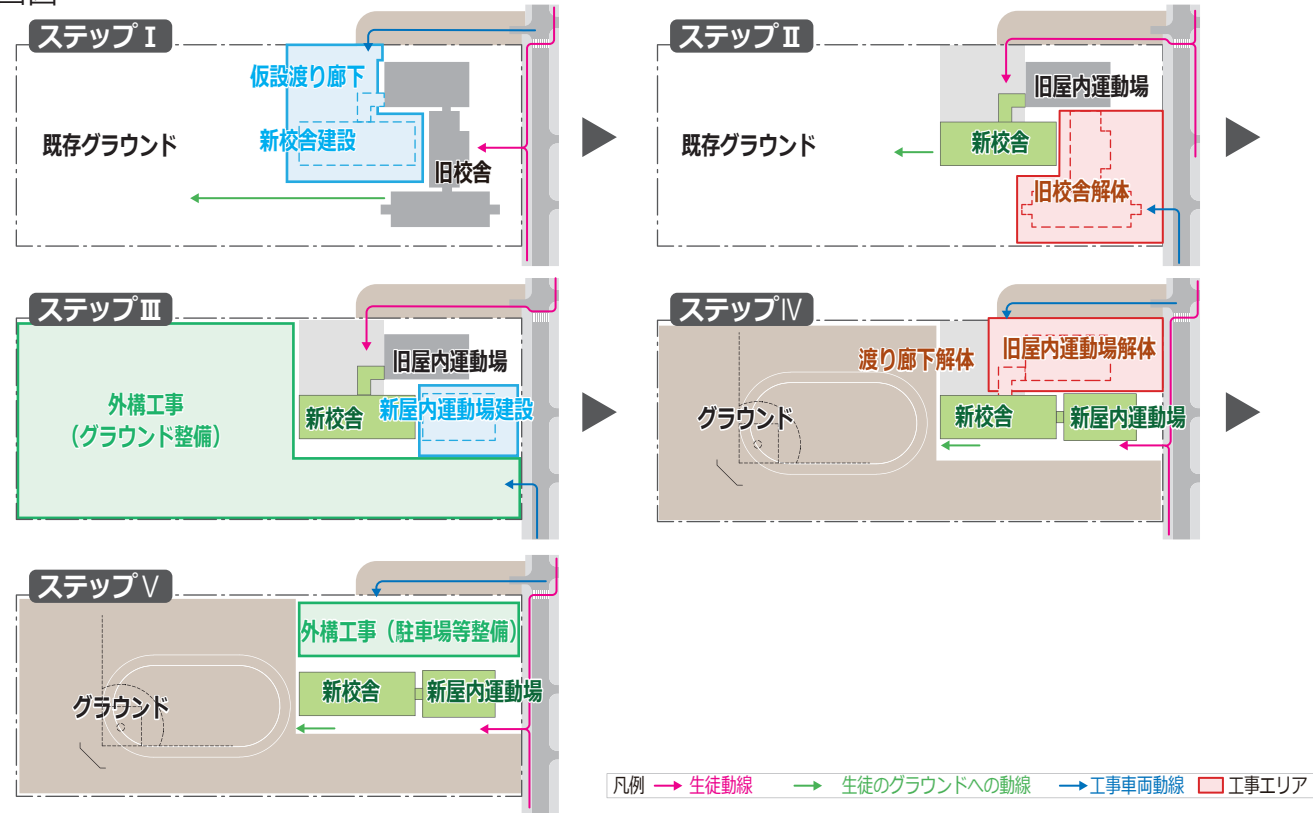

### ■建替スケジュール

令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)			令和9年度 (2027年度)			令和10年度 (2028年度)																
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
令和6年8月着工			令和8年2月竣工			令和8年3月～ 令和8年8月			令和8年9月着工			令和9年9月竣工			令和9年10月～ 令和10年3月			令和10年5月～7月										
ステップⅠ 校舎建設工事 + 仮設渡り廊下建設			ステップⅡ 旧校舎解体工事			ステップⅢ 屋内運動場工事 外構工事 (グラウンド整備)			ステップⅣ 旧屋内運動場解体工事			ステップⅤ 外構工事 (駐車場等整備)																
